1 주민참여예산사업 추진현황 (2025년 시행)

7. 반다비체육센터 출입구 근처에 캐노피형 자전거 거치대 설치 요청 사업 **시민참여**

○ 사업위치 : 양산시 물금읍 부산대학로 34, 반다비체육센터

○ 사업기간 : 2025.04.17. ~ 2025.04.21.

○ 사 업 비 : 3,000천원

○ 사업내용 : 자전거 거치대 구입 및 설치(1개소)

○ 기 타 : (구조) 바닥고정식, 10대 주차 가능

❑ 추진현황

○ '25. 2. : 자전거 거치대 업체 및 가격 시장조사

○ '25. 3. : 자전거 거치대 설치 계획 수립

○ '25. 4. : 계약 체결, 구입 및 설치

❑ 향후 추진계획

○ 설치 완료 후 시설물 상태 점검 및 안전성 확인

❑ 문제점 및 대책

○ 설치 위치 주변 보행자 통행 간섭 가능성 검토

⇒ BF 인증기준(건축물 접근로 유효폭 등) 위반사항 없음

○ 향후 이용자 증가에 따른 추가 설치 요구

⇒ 의견 수렴 후 추가 설치 여부 검토 및 예산 확보

❑ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

예산액	집행실적				
	계	1분기	2분기	3분기	4분기
3,000	2,990		2,990		

❑ 현장사진

사업 전	사업 후
	

1 주민참여예산사업 추진현황 (2025년 시행)

8. 국민체육센터 야외 공연장 및 보행로 배수로 덮개 설치 — 시민참여

○ 사업위치 : 양산시 물금읍 청룡로 33, 중앙국민체육센터

○ 사업기간 : 2025.03.01. ~ 2025.06.08.

○ 사 업 비 : 17,500천원

○ 사업내용 : 야외공연장 주변 및 센터 내 보행로 철재 배수구 안전덮개 설치

○ 기 타 : 25년 6월 첫째 주 설치 예정

❑ 추진현황

○ '25. 3. : 배수로 안전덮개 관련 업체 및 단가 조사

○ '25. 4.

- 설치 예정 배수구 안전덮개 제품 선정
- 설치 면적별 규격 및 설치 수량 결정

❑ 향후 추진계획

○ '25. 5. : 계약 체결 및 납품 일정 조율

○ '25. 6. : 배수구 안전덮개 납품 및 설치

❑ 문제점 및 대책

○ 해당없음

❑ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

예산액	집행실적				
	계	1분기	2분기	3분기	4분기
17,500	-	-	-		

❑ 현장사진

사업 전(설치 장소)	사업 후(설치 예정 제품)
	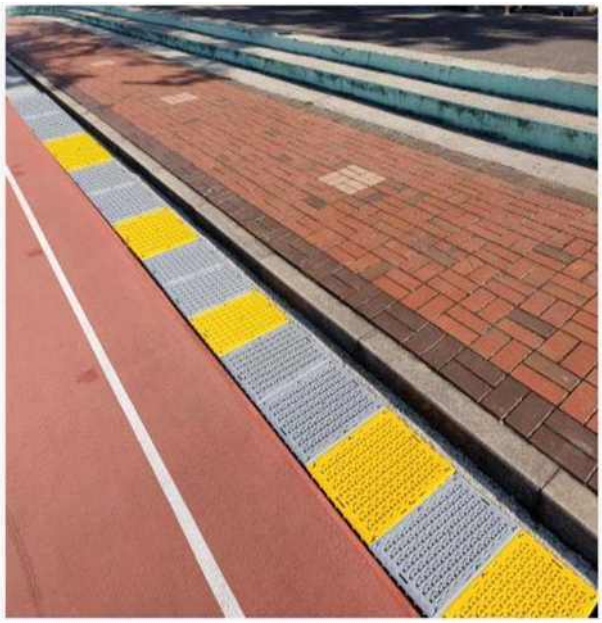

1 주민참여예산사업 추진현황 (2025년 시행)

9. 공공체육시설 전기차 충전소 화재진압용 질식소화포 구입 및 비치 시민참여

○ 사업위치 : 양산시 물금읍 청룡로 33, 중앙국민체육센터
양산시 양산대로 849, 종합운동장
양산시 양산대로 849, 쌍벽루국민체육센터
양산시 동면 강변로 264-1, 양산주민편익시설
양산시 모래들길 57-57, 웅상체육센터
양산시 배움터길 60-19, 웅상체육공원
양산시 대운9길 16-85, 서창운동장
양산시 물금읍 부산대학로 34, 반다비체육센터
양산시 상북면 삼계동길 25, 천성산체육센터
양산시 상북면 봉수대길 29-10, 천성산다목적체육관

○ 사업기간 : 2025.02.01. ~ 2025.06.20.

○ 사 업 비 : 41,250천원

○ 사업내용 : 전기차 충전소 화재진압용 질식소화포 구입(10개소, 15EA)

○ 기 타 : 25년 6월 중 설치 예정

❑ 추진현황

○ '25. 2. : 질식소화포 업체 및 가격 시장조사

○ '25. 3. : 구입예정 질식소화포 제품 선정

○ '25. 4. : 계약 사전절차 및 계약 절차 진행 중

❑ 향후 추진계획

○ ‘25. 5. : 계약 체결 및 납품 일정 조율

○ ‘25. 6. : 질식소화포 납품 및 비치(10개소, 15EA)

❑ 문제점 및 대책

○ 해당없음

❑ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

예산액	집행실적				
	계	1분기	2분기	3분기	4분기
41,250	-	-	-		

❑ 현장사진

사업 전(설치장소 예시)	사업 후(설치예정 품목)
	

1 주민참여예산사업 추진현황 (2025년 시행)

15. 숲애서 숙박3동 중 2층 30객실 피난 경로 마련	시민참여

○ 사업위치 : 양산시 탑골길 248, 숲애서

○ 사업기간 : 2025.02.17. ~ 2025.03.06.

○ 사 업 비 : 8,768천원

○ 사업내용 : 숙박동 2층용 수직강하형 구조대 설치(6개소)

○ 기 타 : -

❑ 추진현황

○ 2025. 2. 17. : 실시설계 완료 및 계약체결

○ 2025. 3. 4. : 구조대 납품 및 설치 착공

○ 2025. 3. 6. : 설치 공사 완료

❑ 향후 추진계획

○ 구조대에 대한 지속적 유지관리 및 점검 실시

○ 이용객 대상 구조대 사용법 안내 및 교육 추진

❑ 문제점 및 대책

○ 숲애서 이용객 비상탈출용 구조대 사용법에 대한 인지도 및 이해부족으로 인한 대응 미흡 우려

⇒ 전 직원 대상으로 사용법 교육 실시 예정(상·하반기 예정)

⇒ 이용객 대상 구조대 사용법 안내 실시

❑ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

예산액	집행실적				
	계	1분기	2분기	3분기	4분기
8,768	8,316	8,316	-	-	-

❑ 현장사진

사업 전	사업 후
	
